



Pfarreineugründung

Überlegungen zum Zeitpunkt



Pastoraler Weg

Unser Standort



Phase 1

- Zusammenarbeit im Dekanat
- Bildung von Teilprojektteams zu verschiedenen Themen
- Erarbeitung des Pastoralkonzepts

Phase 2

- Zusammenarbeit im Pastoralraum
- Vorbereitung der Pfarrei Gründung
- Pastoralraumkonferenz als wichtiges Gremium
- Arbeit in Projektgruppen und Teams

Phase 2A

- Kennenlernen
- Vertrauensbildung
- Miteinander


Phase 2B

- Unmittelbare Vorbereitung der Pfarrei Gründung


Phase 3

- Zusammenarbeit in der neuen Pfarrei
- Arbeit in Pfarreirat und Gemeindefräusschüssen
- Neue Pfarrei als Netzwerk von Gemeinden und Kirchorten


Pastoraler Weg im Bistum Mainz

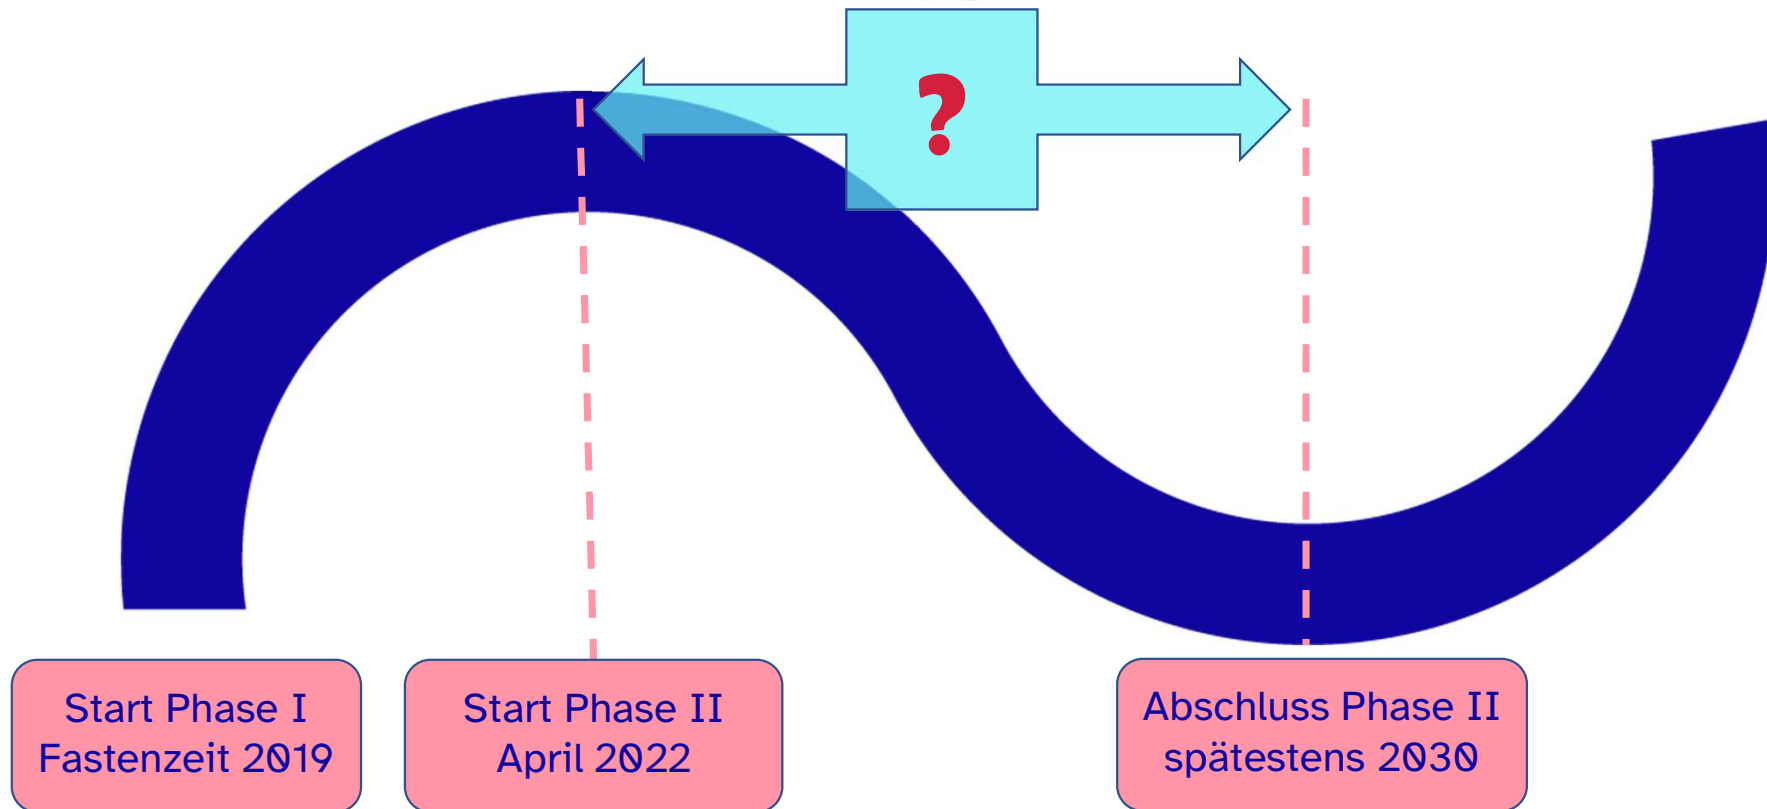

Pastoralraum Mainz-Süd Phase II

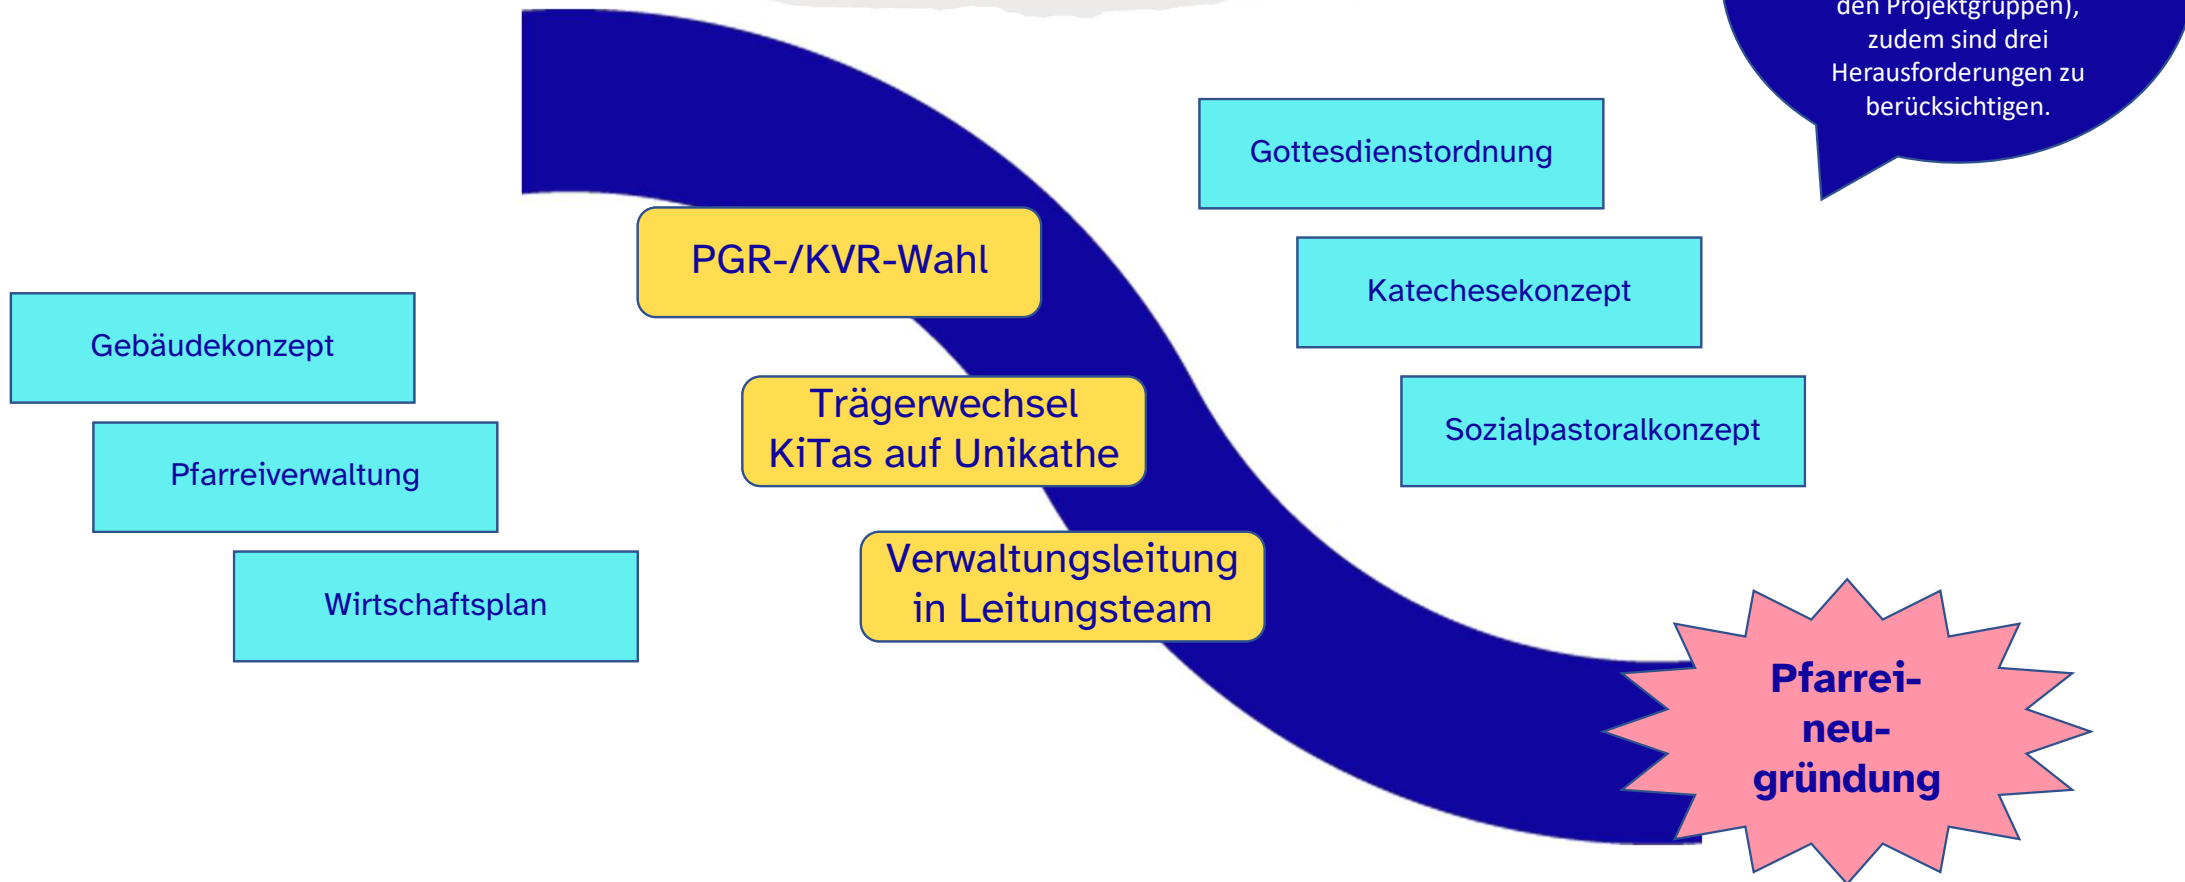

Pastoralraum Mainz-Süd Phase II



Wirtschaftsplan	Pfarreiverwaltung	Gebäudekonzept	
Sozialpastoralkonzept	Gottesdienstordnung	Katechesekonzept	
Aufgaben	PGR- /KVR- Wahl	Uni- kathe	Verwal- tungs- leitung

Pastoralraum Mainz-Süd Phase II

Pfarrei-
neu-
gründung

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Gebäudekonzept


Pfarreiverwaltung

PGR-
/KVR-
Wahl

Verwal-
tungs-
leitung

Uni-
kathe

Pastoralraum Mainz-Süd Phase II

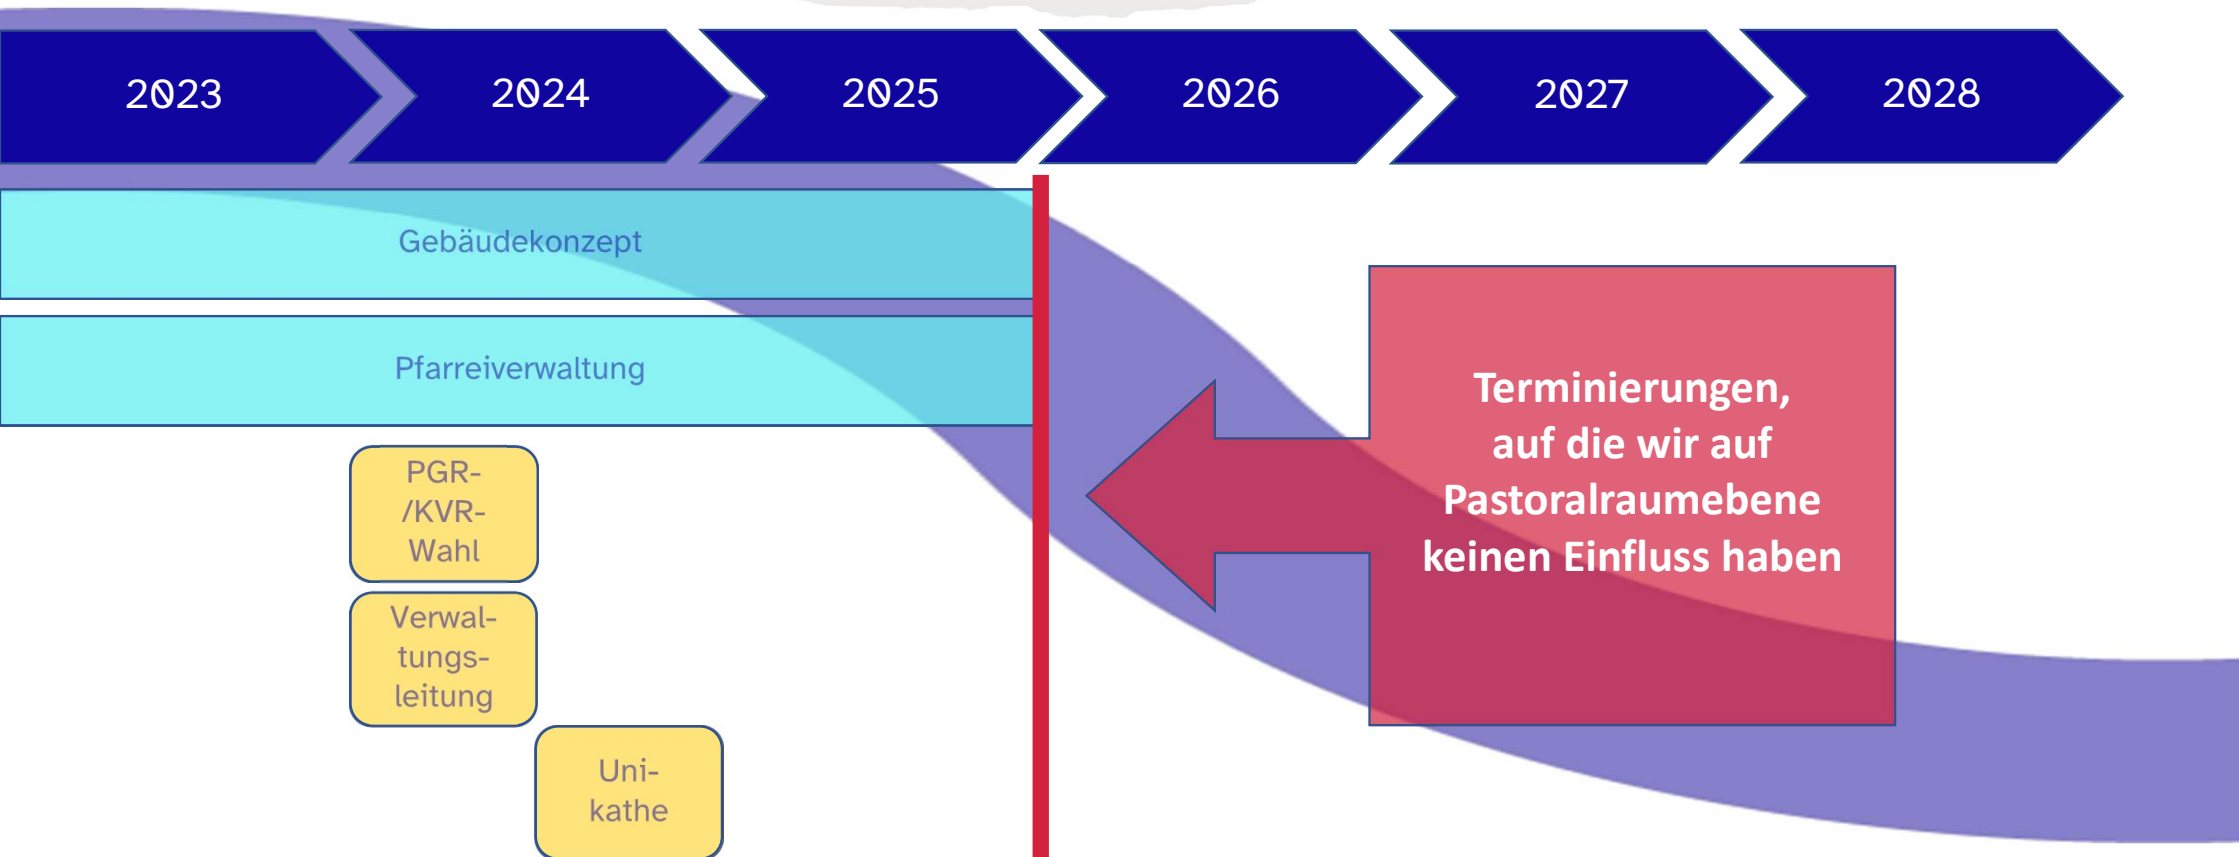

Pastoralraum Mainz-Süd Phase II



2023

2024

2025

2026

2027

2028

Projektgruppe Gottesdienste

Projektgruppe Katechese

Projektgruppe Sozialpastoral

2023:
Bestandsaufnahme,
Zielformulierung

2024:
Konzeptentwicklung

2025:
Votum Pastoralraum-
konferenz, ggf.
Stellungnahme
Gremien, Erprobung

Pastoralraum Mainz-Süd Phase II

Pfarrei-
neu-
gründung

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Projektgruppe Vermögen


Schritt 1 Bestandsaufnahme:

- Bilanzen
- Wirtschaftspläne
- Anlagevermögen
- Vertragsverzeichnis
- Liegenschaftsverzeichnis

nicht alles
beeinflussbar,
Zeitbedarf
unklar


Schritt 2:

- Eröffnungsbilanz-
struktur
- konsolidierter
Wirtschaftsplan



Regelung aus der Ordnung für Pastoralräume:
<https://bistummainz.de/export/sites/bistum/pastoralraum/mainz-sued/galleries/dokumente/Ordnung-fuer-die-Pastoralraeume-und-GO-PRK-Amtsblatt-2023-03.pdf>

Pastoralraum Mainz-Süd




**Pfarrei-
neu-
gründung**

Wichtige Punkte zu bedenken:

- PGR-Wahlen erfordern Ressourcen und führen vermutlich zu Personenwechseln
- Trägerwechsel der KiTas auf Unikathe bindet Ressourcen
- Verwaltungsleitung muss gefunden und eingearbeitet werden
- Teilprozesse mit hoher Beteiligung wie Namensfindung benötigen ausreichend Zeit
- Kommunikationswege erfordern Zeit
- neben der Erstellung des Gesamt-Pastoralkonzepts sind formale Vorbereitungen zu treffen wie
 - Planung der Struktur und der Wahlen der neuen Pfarrei-Räte
 - Anpassung der Stellenbeschreibungen des Pastoralteams und der Sekretärinnen
 - Vertragsanpassungen bzw. Information an Vertragspartner
 - Siegel
 - Implementierung neuer EDV-Strukturen (Nextcloud, Churchdesk usw.)
 - Konzept Öffentlichkeitsarbeit
 - Institutionelles Schutzkonzept
 - Arbeitsschutzkonzept
 - Datenschutzkonzept

Pastoralraum Mainz-Süd



**Pfarrei-
neu-
gründung**

1. Möglicher Zeitpunkt 01.01.2026

- Projektgruppe Gebäude fertig zum 31.07.2025
- Projektgruppe Verwaltung ab 01.08.2025 nur noch Detailplanung
- Projektgruppen Gottesdienste, Katechese und Sozialpastoral gut schaffbar
- Projektgruppe Vermögen unklar wegen Abhängigkeit von der ZBS, DVS und den Verwaltungsräten der vier Gemeinden
- Kommunikationswege müssen zügig gegangen werden
- Verwaltungsleitung sollte zeitnah gefunden werden
- PGR-Wahl 2024 und erneute Gremienwahl (Pfarreirat und Verwaltungsrat der neuen Pfarrei) im ersten Quartal 2026


2. Möglicher Zeitpunkt 01.01.2027

- Projektgruppe Gebäude fertig zum 31.12.2025
- Projektgruppe Verwaltung ab 01.01.2026 ein Jahr Zeit für Detailplanung
- Projektgruppen Gottesdienste, Katechese und Sozialpastoral abgeschlossen, Konzepte werden implementiert oder liegen „in der Schublade“
- Projektgruppe Vermögen hätte ausreichend Zeit
- Kommunikationswege haben weniger Zeitdruck
- Verwaltungsleitung unterstützt ggf. erst später

3. Möglicher Zeitpunkt 01.01.2028

- Projektgruppe Gebäude fertig zum 31.12.2025
- Projektgruppe Verwaltung ab 01.01.2026 mindestens ein Jahr Pause bis zur Detailplanung
- Projektgruppen Gottesdienste, Katechese und Sozialpastoral lange abgeschlossen, Konzepte werden implementiert oder liegen „in der Schublade“
- Projektgruppe Vermögen mindestens ein Jahr Pause bis zur unmittelbaren Gründungsvorbereitung
- Verwaltungsleitung wird erst viel später tätig

Pastoralraum Mainz-Süd



Pfarrei-
neu-
gründung

4. Möglicher Zeitpunkt 01.01.2029


- Projektgruppe Gebäude fertig zum 31.12.2025
- Projektgruppe Verwaltung ab 01.01.2026 mindestens zwei Jahre Pause bis zur Detailplanung
- Projektgruppen lange abgeschlossen, Konzepte werden implementiert oder liegen „in der Schublade“
- zwei Jahre Leerlauf bis zu den unmittelbaren Gründungsvorbereitungen
- PGRs und KVRs verlängerte Amtszeit bis 31.12.2028

Entscheidungsprozess

- PGRs und KVRs der vier Gemeinden geben ihre Stellungnahmen bis 31.05.2023 an die Steuerungsgruppe
- die Stellungnahmen werden der Pastoralraumkonferenz bekannt gemacht
- Votum der Pastoralraumkonferenz am 27.06.2023
- Einreichung des Votums der Pastoralraumkonferenz und der sieben Stellungnahmen der Gremien bei der Koordinationsstelle des Bistums bis 30.06.2023
- Entscheidung der Koordinationsstelle bis Herbst 2023 (Anmerkung: das Bistum kann pro Zeitpunkt nur eine maximale Anzahl von Pfarreien neu gründen)

Pfarreineugründung

Überlegungen zum Zeitpunkt



Saskia Kuschetzki

Koordinatorin des Pastoralraums Mainz-Süd

Präventionskraft

Bergstr. 39

55129 Mainz

0 61 31 - 6 10 64 88

saskia.kuschetzki@bistum-mainz.de

